

Trenque Lauquen, 18 de Octubre de 2021

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: ACACIAS IV**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Acacias IV, ubicado en la calle Alem 859 de la ciudad de Trenque Lauquen.

En esta oportunidad queremos contarles que la obra se encuentra con un grado de avance del 93%.

Al día de la fecha, se conectaron todos los tableros de electricidad principales al gabinete de medidores. Colocamos todos los muebles de cocina, un 50% de las mesadas y revestimientos cerámicos en cocinas.

Finalizamos el contrapiso de hormigón del estacionamiento y los detalles de terminación de los muros. También, les contamos que estamos trabajando en detalles de terminación de pintura en interiores y herrería.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra.

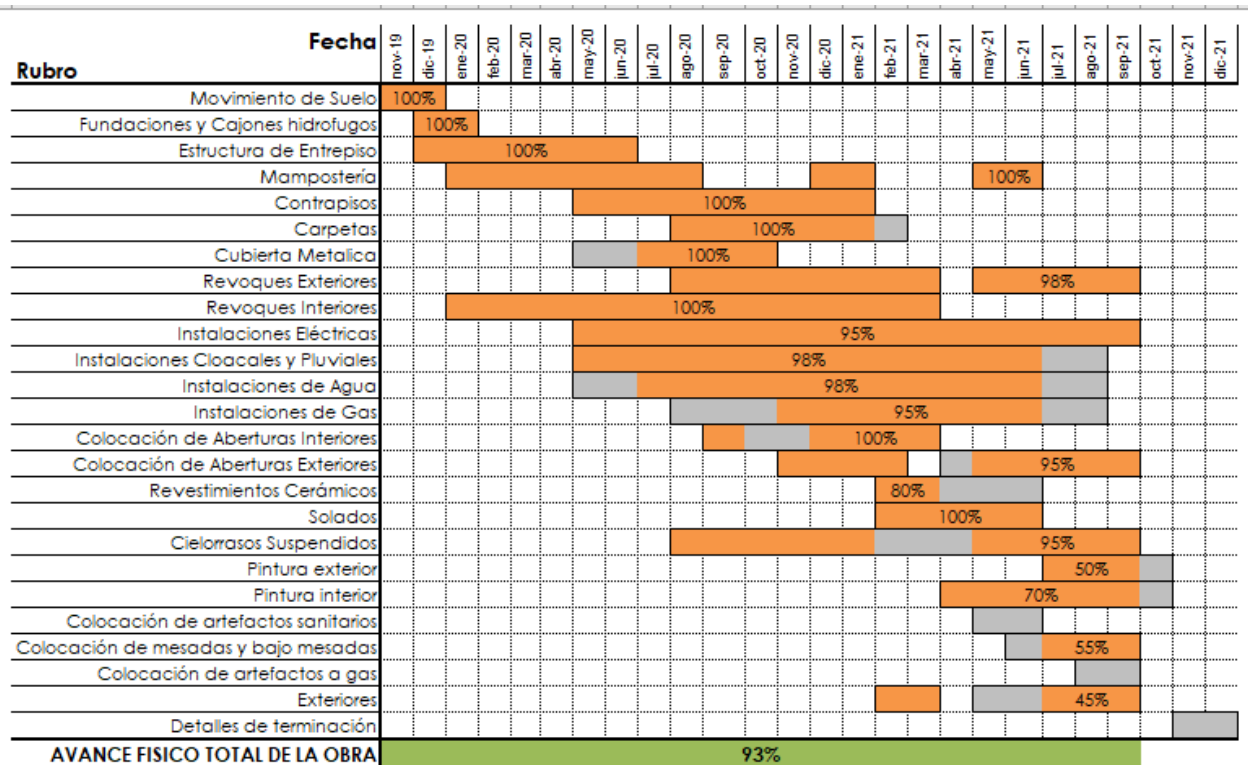

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas finalizaremos la colocación de mesadas y revestimientos en cocinas.

Tenemos programado continuar con tareas de pintura en barandas, rejas y terminaciones. Comenzaremos a realizar limpieza general de obra, probar instalaciones y ajustar detalles.

Por último, les contamos que realizaremos las conexiones de gas y agua a sus respectivas redes. Las cloacas ya están conectadas.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas realizadas hasta el momento.



Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF

0810-2222-443

e-mail: info@grupogif.com.ar

web: www.grupogif.com.ar
