

**Chivilcoy, 20 de Octubre de 2021**


**REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
 EMPRENDIMIENTO: ALAMOS IX**

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Alamos IX, ubicado en la calle Almafuerde 82 de la ciudad de Chivilcoy.

Al día de la fecha el edificio está hormigonado hasta la losa sobre el tercer piso. En las últimas semanas comenzamos los trabajos de albañilería en planta baja y primer piso, levantando mampostería perimetral, ejecutando carpetas y contrapisos.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

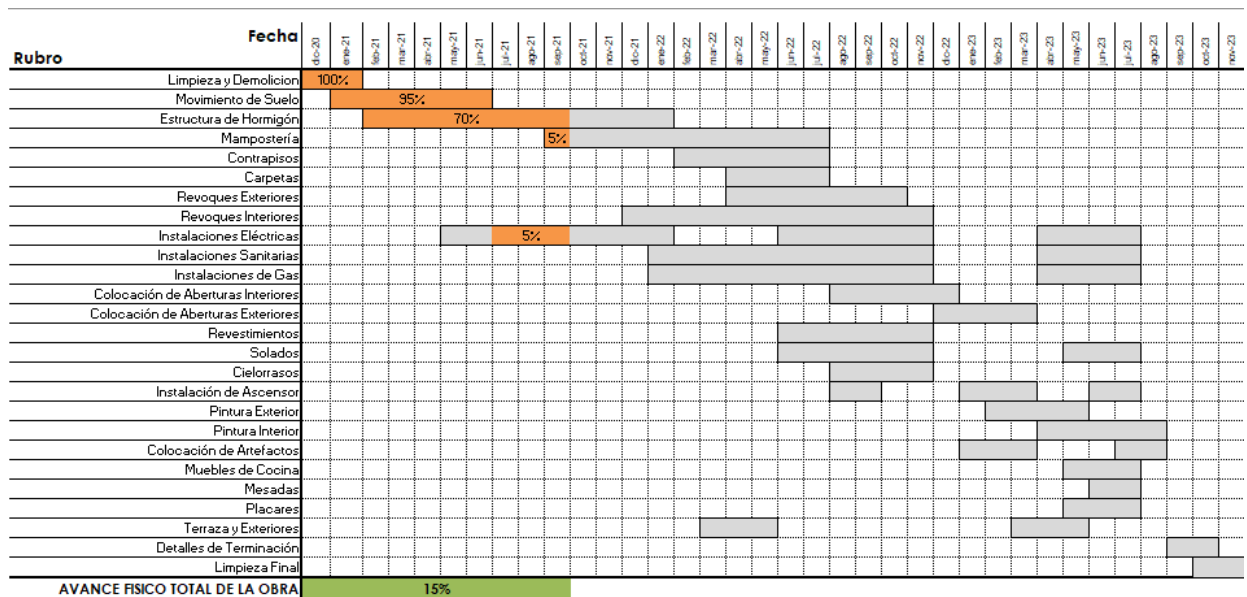

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas finalizaremos la parte estructural del edificio, hormigonando la losa sobre el cuarto piso, sala de máquina y cierre.


Tenemos programado seguir con trabajos de albañilería en planta baja y primer piso con la mampostería interna, revoques y recuadros, continuando con las mismas tareas en el segundo piso.

Por último, les contamos que comenzaremos con las instalaciones de plomería, gas, calefacción y electricidad.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



ESCALERA 1° PISO

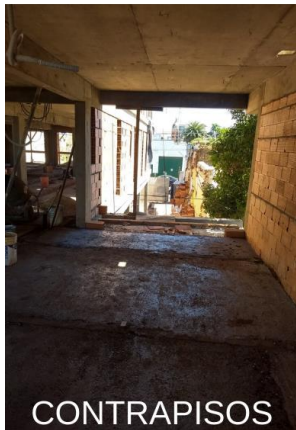

CONTRAPISOS



VISTA DEL PRIMER PISO AL CONTRAFRENTE



FRENTE DE LA OBRA



CONTRAFRENTE DE LA OBRA

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

**Grupo GIF**  
0810-2222-443  
e-mail: [info@grupogif.com.ar](mailto:info@grupogif.com.ar)  
web: [www.grupogif.com.ar](http://www.grupogif.com.ar)
