

Chivilcoy, 26 de Abril de 2022

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRESA: ALAMOS IX**


Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Alamos IX, ubicado en la calle Almafuerde 82 de la ciudad de Chivilcoy.

Les informamos que durante los últimos meses finalizamos las tareas de albañilería de 2do y 3er piso y continuamos con trabajos de plomería e inspecciones de gas en 3er piso.

Seguimos avanzando con las instalaciones eléctricas y preinstalaciones de aire acondicionado. También les contamos que realizamos el hormigón alisado en cocheras.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

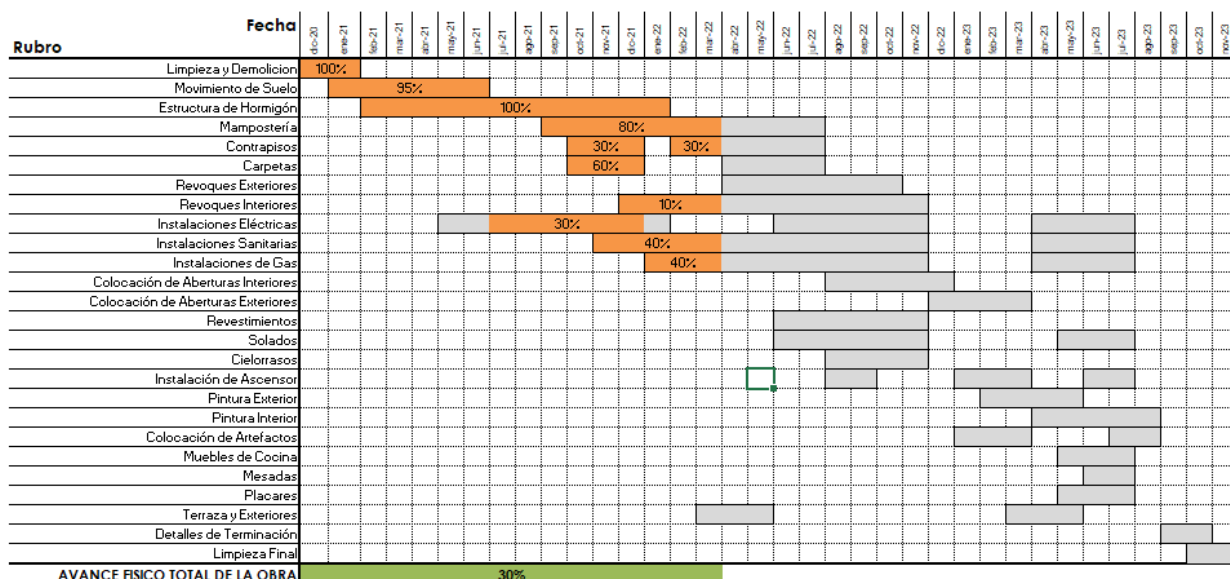

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas continuaremos trabajando en 4to piso, sala de maquina y tanque con tareas de albañilería (mampostería, contrapisos, carpetas, revoques y recuadros).

Continuaremos con la plomería e inspecciones de gas del 3er y 4to piso. También seguiremos trabajando en preinstalaciones de aire e instalaciones eléctricas.

En las próximas semanas tenemos programado comenzar con el revoque exterior del edificio.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



FRENTE DE OBRA



CONTRAFRENTE DE OBRA



LIVING COCINA



ESTACIONAMIENTO COCHERAS



VISTA AL BALCÓN - FRENTE



INSTALACIONES PARA RADIADORES

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
02346-15416294
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
