

Chivilcoy, 18 de agosto de 2022

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPREDIMIENTO: ALAMOS IX**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Alamos IX, ubicado en la calle Almafuerte 82 de la ciudad de Chivilcoy.

Les informamos que durante los últimos meses finalizamos las tareas de plomería e inspecciones de gas en 3er piso, como las preinstalaciones de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.

Seguimos avanzando con las instalaciones eléctricas, plomería, gasista y calefacción en el 4to piso. A su vez, continuaremos con el armado de plenos y tanques.

Estaremos finalizando las tareas de albañilería (mampostería, contrapisos, carpetas, revoques y recuadros) del 4to piso, sala de máquinas y tanques.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

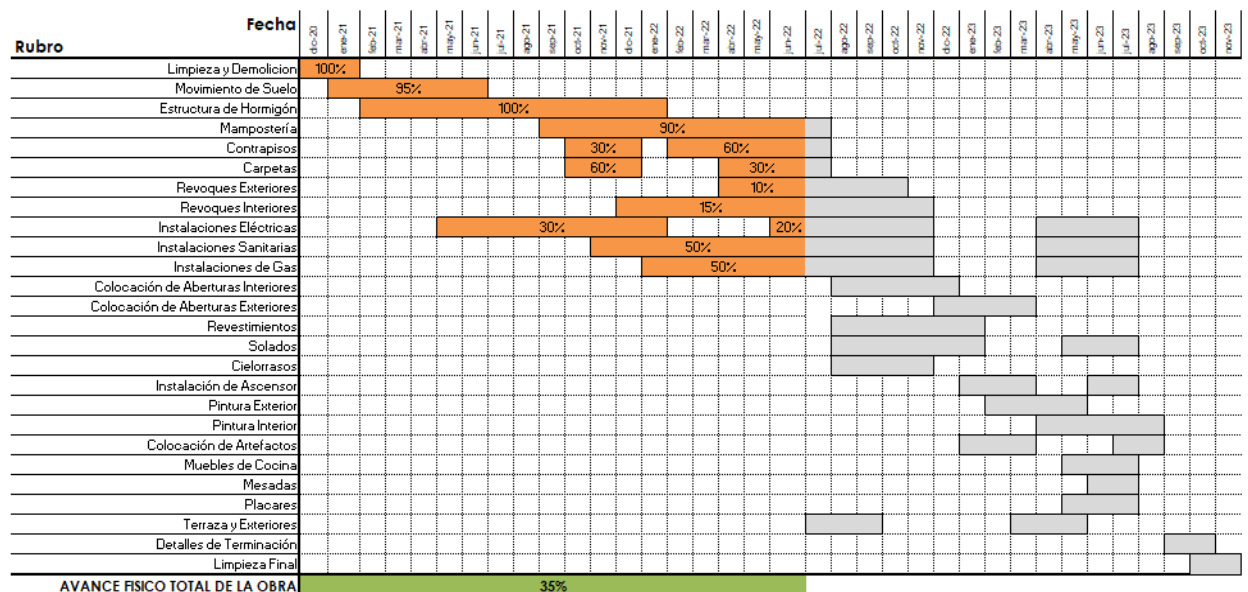

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas continuaremos trabajando en planta baja con las tareas de albañilería, e impermeabilización en balcones y terraza.

Para el mes de septiembre tenemos programado comenzar con las tareas de yeso interior y continuar con el revestimiento del contrafrente, fachada del edificio y patios de luz.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



FRENTE DE LA OBRA



CONTRAFRENTE DE LA OBRA



VISTA DE LA HABITACIÓN



VISTA DEL PASILLO



VISTA COCINA/COMEDOR



VISTA DE MEDIANERA

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
02346-15416294
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
