

Chivilcoy, 1 de noviembre de 2022

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRESA: ALAMOS IX**

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del emprendimiento Alamos IX, ubicado en la calle Almafuerte 82 de la ciudad de Chivilcoy.


Les informamos que seguimos trabajando en planta baja con las tareas de albañilería, e impermeabilización en balcones y terraza.

El electricista se encuentra trabajando en las unidades del primer piso, al igual que colocadores (pisos, zócalos, revestimiento de cocina y baño) y durleros.

Estamos terminando con las pruebas de las instalaciones.

Estaremos finalizando las tareas de yeso en el segundo piso.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

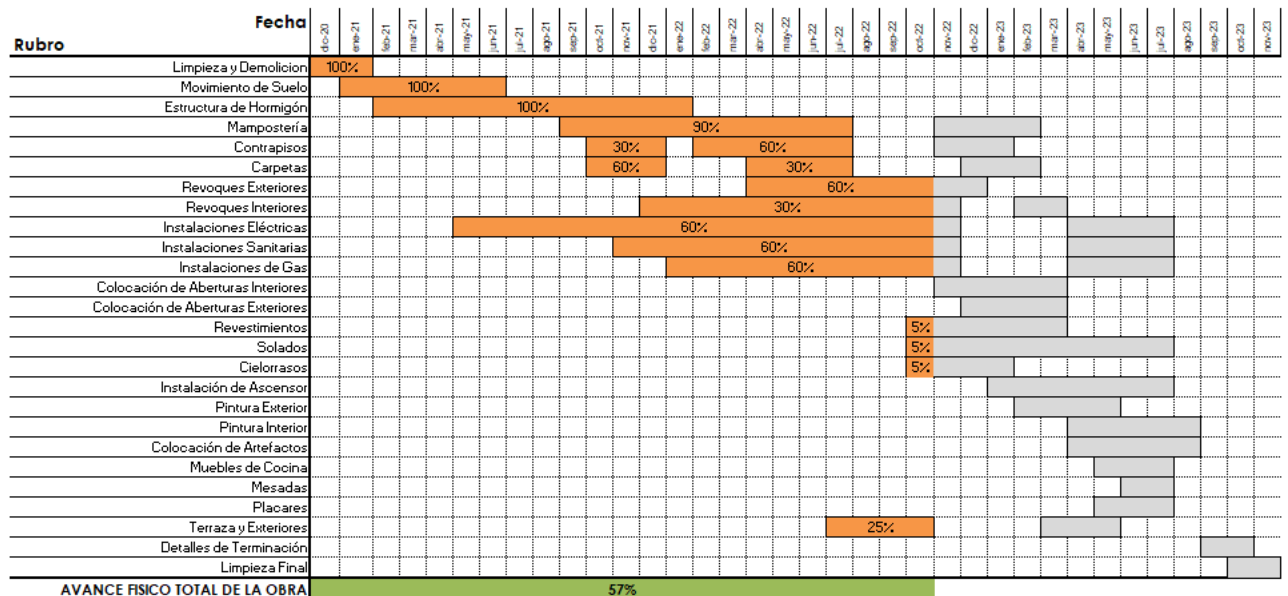

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas continuaremos con los trabajos de yeso en el tercer piso.

Para los próximos meses tenemos programado comenzar con el revestimiento 4 en 1 (ceresita, revoque grueso, revoque fino y, terminación, textura y color) en el frente del edificio.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.




VISTA DEL FRENTE DE OBRA



VISTA DEL CONTRAFRENTE DE OBRA



VISTA DEL BAÑO

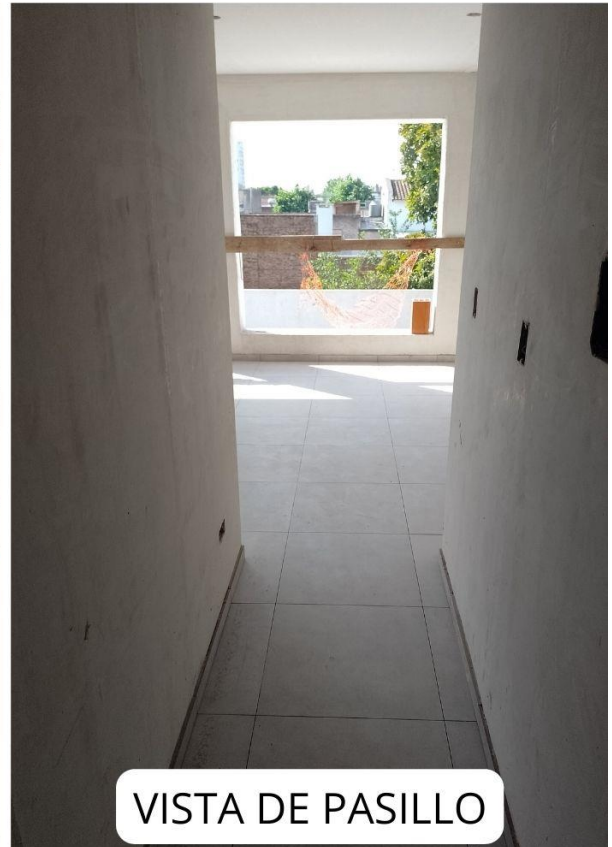

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
02346-15416294
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
