

Chivilcoy, 15 de julio de 2026

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPREDIMIENTO: ALAMOS XIII**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con motivo de compartirles un nuevo informe de avance de obra del emprendimiento Álamos XIII, ubicado en Bouchardo 237 de la ciudad de Chivilcoy.

En esta oportunidad queremos contarles que se completaron los trabajos de excavación correspondientes al subsuelo, junto con la ejecución de las bases previstas para dicho sector.

Se avanzó significativamente con la estructura de fundación del edificio, encontrándose ejecutado aproximadamente el 75% de las bases proyectadas.

Actualmente, continúan los trabajos de armado de la submuración del subsuelo, etapa previa a la ejecución de las vigas de encadenado, el piso de hormigón y la losa de entrepiso.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

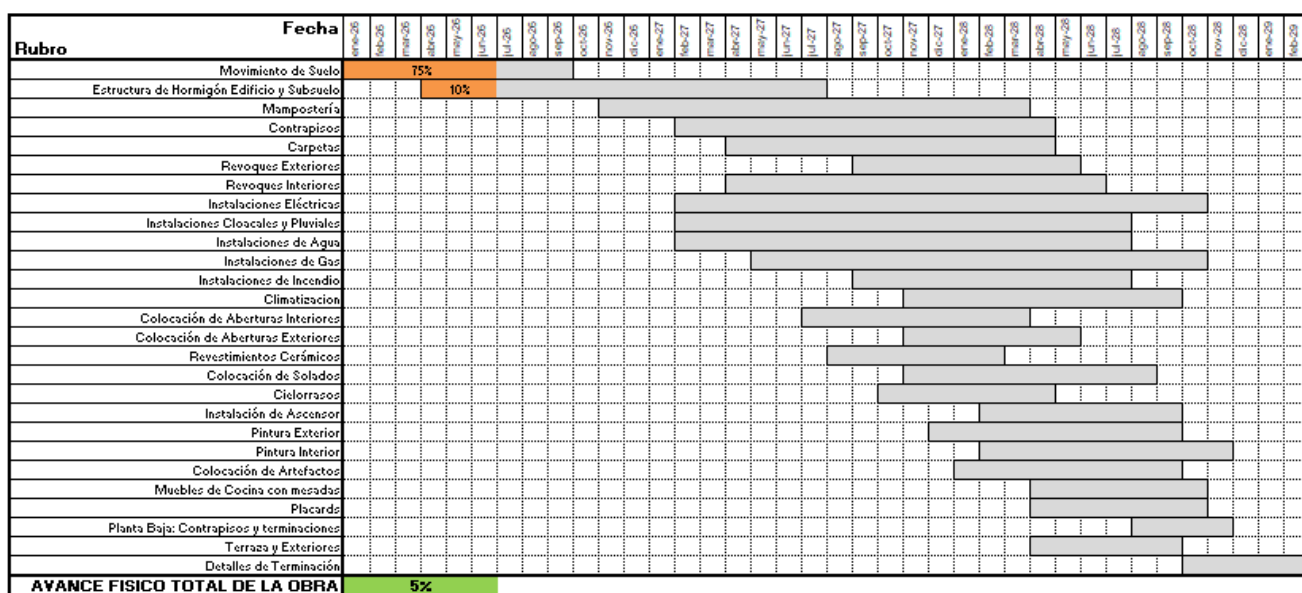

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que en los próximos meses se prevé completar la submuración del subsuelo, la ejecución de las vigas de encadenado, el piso de hormigón y la losa de entrepiso.

Se avanzará con la ejecución de las bases restantes y de las cámaras pluviales destinadas a la contención y reutilización de agua de lluvia.

Una vez finalizadas estas tareas, se dará continuidad a la estructura de planta baja mediante la ejecución de las vigas de encadenado correspondientes y los trabajos preparatorios para la primera losa sobre planta baja.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.





Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
0810-2222-443
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
