

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

### EMPRENDIMIENTO: CEIBO VI

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de presentarles un nuevo informe de avance de obra, del emprendimiento El Ceibo VI, ubicado en Roca y Freyre de la ciudad de Trenque Lauquen.

En esta oportunidad queremos contarles que finalizamos la preinstalación de aires acondicionados y la instalación de gas en el interior de los departamentos.


También concluimos con la colocación de puertas placa en interiores y puertas metálicas de acceso a las viviendas.

Comenzamos con la ejecución de revocos finos en el interior de los departamentos y la colocación de pisos y revestimientos en baños.

Además, nos encontramos amurando los portones en accesos vehiculares y las barandas en escaleras, y realizando el tendido de cañería de gas desde el interior de los departamentos hacia el gabinete de medidores.

Por otra parte, iniciamos la colocación de aberturas exteriores de aluminio.


A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra.




Daremos comienzo al cableado eléctrico correspondiente a los circuitos de iluminación, tomas y aires acondicionados y finalizaremos la colocación de aberturas exteriores.

Por último, se realizarán tareas preliminares de pintura y se ejecutarán los cielorrasos suspendidos.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas realizadas hasta el momento.

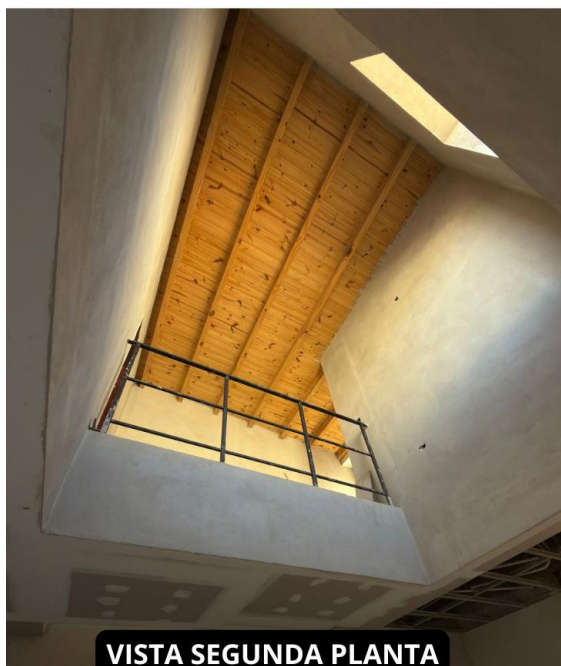

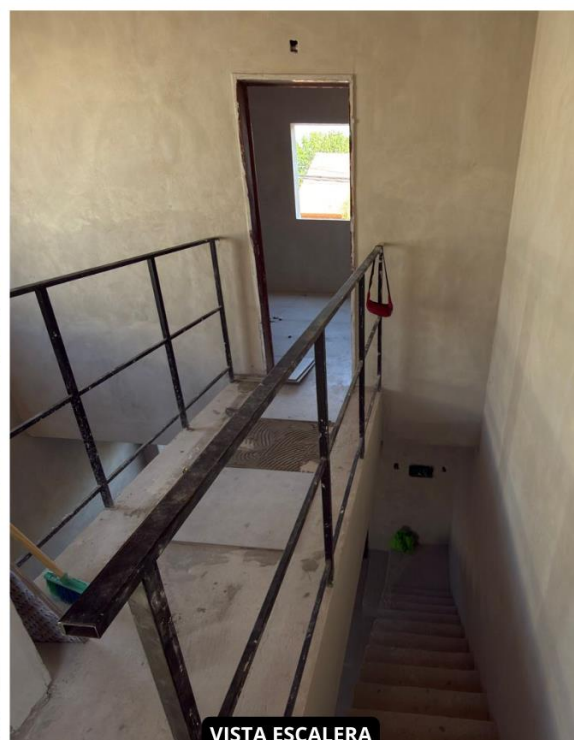

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

**Grupo GIF**  
02346-15416294  
e-mail: [info@grupogif.com.ar](mailto:info@grupogif.com.ar)  
web: [www.grupogif.com.ar](http://www.grupogif.com.ar)
