

Santa Rosa, 7 octubre de 2025

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPREDIMIENTO: TORRE LOLA**

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de compartirles un nuevo informe de avance de obra del emprendimiento Torre Lola, ubicado en Leandro N. Alem 56 de la ciudad de Santa Rosa.


En esta oportunidad queremos contarles que finalizamos con el hormigonado de las losas desde el 1er piso hasta el piso 13 junto con las escaleras de servicio.

Comenzamos con la albañilería del edificio.

Realizamos la totalidad de los muros desde el 1er al 3er piso. Actualmente estamos trabajando en los pisos 4 y 5.

Además, comenzamos con los revoques interiores en baños y cocinas del 1er piso.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

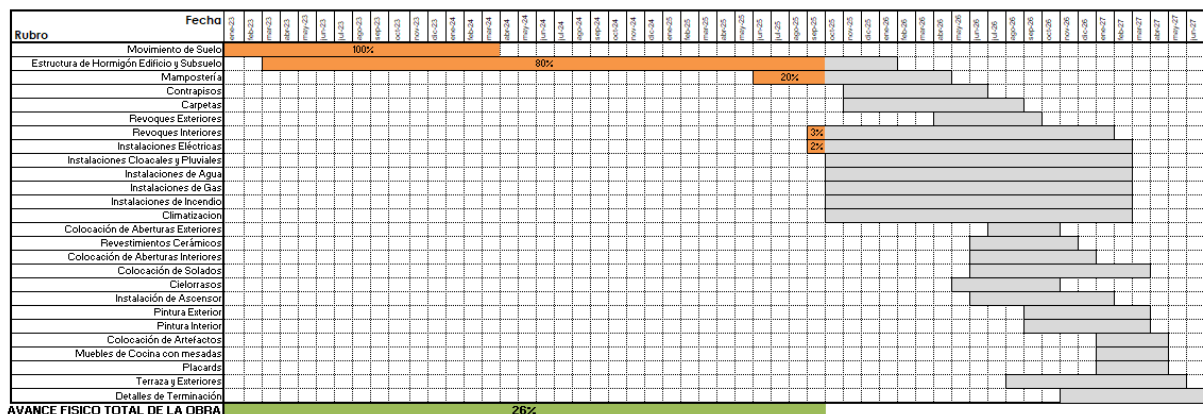

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que en los próximos días comenzaremos con las instalaciones eléctricas, cloaca y agua en interior de departamentos, así como la instalación de cañería por piso para la climatización.

Continuaremos con los muros de mampostería y revoques en baños y cocinas.

Y en los próximos meses hormigonaremos la losa del piso 14, y piso de sala de máquinas.


A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



VISTA COCINA-COMEDOR



VISTA FRENTE

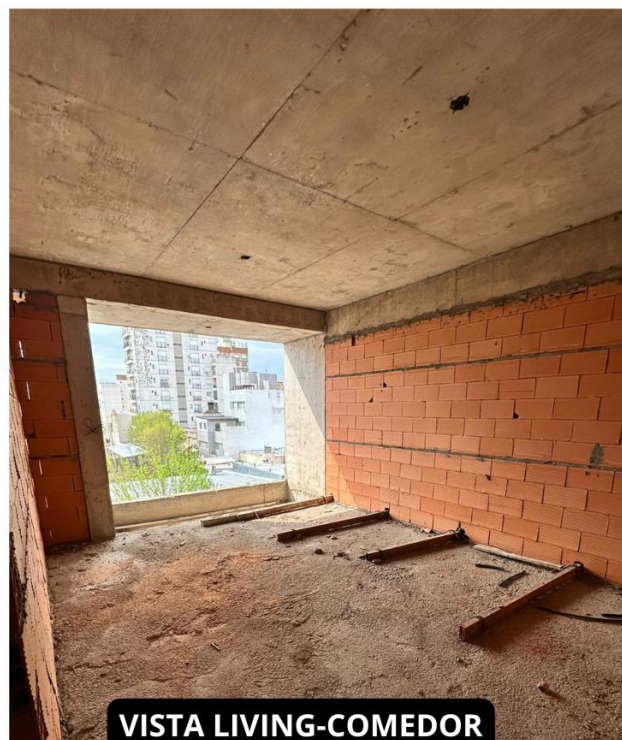

VISTA LIVING-COMEDOR



Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
web: www.grupogif.com.ar
