

Santa Rosa, 18 de Octubre de 2021

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: ALAMOS VIII**


Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del edificio Álamos VIII, ubicado en la calle Alem 254 de la ciudad de Santa Rosa.

En este informe les queremos contar que finalizamos la mampostería de todo el edificio, faltando solo la planta baja. Completamos desde el primer al sexto piso la instalación de gas y agua. En estos días estamos trabajando en las pre instalaciones de aire acondicionados en el primer piso.

Ejecutamos el tendido de caños del sistema de calefacción por radiadores en primer, tercer y cuarto piso. También finalizamos el contrapiso y carpeta hidrófuga en terrazas, previa colocación de aislación térmica.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.

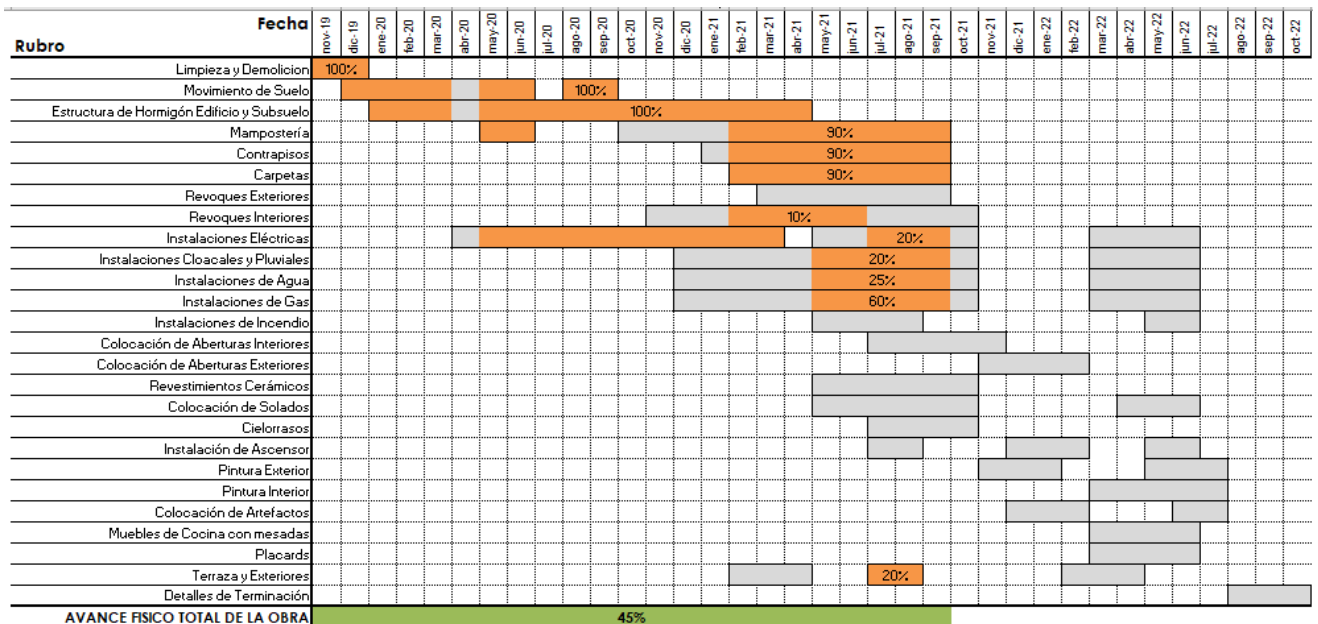

Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que durante las próximas semanas comenzaremos los trabajos de yeso proyectado y ejecución de cielorraso suspendido.

En noviembre continuaremos con la instalación cloacal en general. En el séptimo piso, realizaremos la instalación de agua y gas. También ejecutaremos el tendido de caños del sistema de calefacción por radiadores en quinto, sexto y séptimo piso.

Por último, les contamos que trabajaremos en la preinstalación de aires acondicionados desde el segundo al séptimo piso.


A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.




TERRAZA DEL EDIFICIO



FRENTE DE LA OBRA

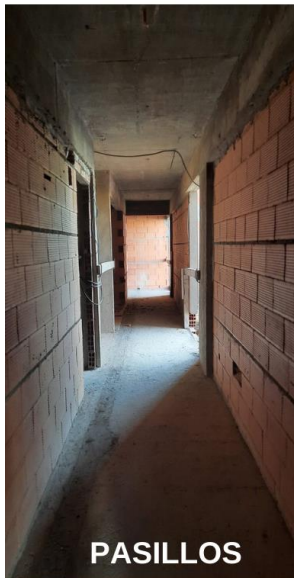

PASILLOS

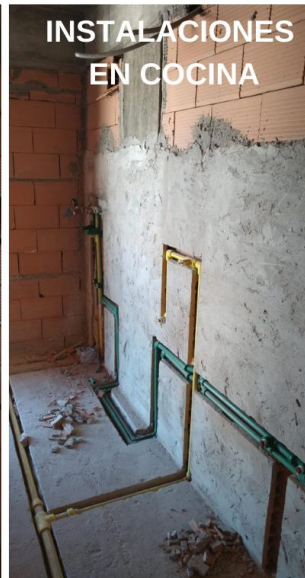

INSTALACIONES EN COCINA



VISTA LIVING COCINA



CONTRAFRENTE DEL EDIFICIO

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
0810-2222-443
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
